


# ΑΠΟ ΒΔΟΜΑΔΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΝ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ Μπαίνει νερό στην Κάρλα!

\* Σύσκεψη περιφερειάρχη με ΕΥΔΕ και Φορέα Διαχείρισης Κάρλας

Ξεκινά από την ερχόμενη εβδομάδα να μπαίνει νερό στην Κάρλα. Αυτό έγινε γνωστό μετά από σύσκεψη που είχε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός με τη δήμαρχο Ρήγα Φεραίου κα Ελένη Λαϊτσου, την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας (ΕΥΔΕ) και τον Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίου. Αντικείμενο της σύ-

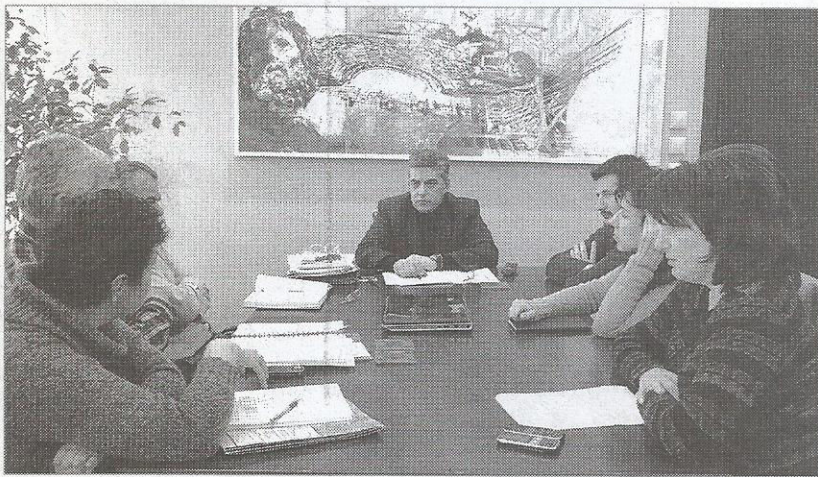

σκεψης ήταν τα έργα για την ανασύσταση της Λίμνης Κάρλας αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η λίμνη καθώς πολλές από τις εργολαβίες που υλοποιεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής έχουν παγώσει, ενώ και διάφορες άλλες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις εμποδίζουν τη συνέχιση των έργων. Λύση όμως δόθηκε στο έργο που αφορά στην «Κατασκευή των έργων μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης Κάρλας (αρδευτικό) προϋπολογισμού 24.842.941 ευρώ καθώς όπως ανέφερε ο κ. Αγοραστός το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Αλ. Μπαλτατζής» προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρωθεί.

«Το έργο επανασύστασης της Λίμνης Κάρλας είναι ένα από τα μεγαλύτερα αντιπλημμυρικά και εξυγιαντικά έργα της Θεσσαλίας. Με το έργο πολλαπλής σκοπιμότητας ανασύστασης της λίμνης Κάρλας που έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 65 με 70%, θα αντιμετωπιστούν σοβαρά προβλήματα των Π.Ε. Λάρισας και Μαγνησίας, όπως η προστασία από πλημμύρες και η ρύπανση του Παγασπητικού, η υφαλμύρωση των υπόγειων υδροφορέων της ευρύτερης περιοχής, η άρδευση χιλιάδων στρεμμάτων που αρδεύονται πλημμελώς, ενώ ταυτόχρονα θα αποκατασταθεί μερικώς το προϋπάρχον οικοσύστημα της Κάρλας και θα διασφαλιστεί στο μέλλον η «αειφορία» στη διαχείριση των εδαφικών και υδατικών πόρων. Εμείς επιδιώκουμε να συνεχιστούν τα έργα που εκκρεμούν. Η προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο γραφειοκρατικών διαδικασιών για την αποφυγή ευθυνών» τόνισε ο κ. Αγοραστός και συνέχισε:

«Η αποκέντρωση του κράτους πρέπει κάποτε να γίνει πράξη. Αν τα έργα στην Κάρλα υλοποιούνταν από την Αιρετή Περιφέρεια Θεσσαλίας, δεν θα είχαμε σήμερα αυτά τα προβλήματα. Εμείς εκπέμπουμε ένα μήνυμα αποτελεσματικότητας». Αναφερόμενος στο ρόλο του αρμόδιου υπουργείου τόνισε: «Οι εργολαβίες πρέπει να συνεχιστούν και το αντλιοστάσιο στον Πηνεϊό πρέπει να λειτουργήσει άμεσα. Το ΥΠΕΚΑ πρέπει να αποφασίσει ποιος θα διαχειρίζεται το έργο αυτό και με ποιο τρόπο και όχι να αφήνει μετέωρη μια ολόκληρη περιοχή και τους ανθρώπους της».

υπολογισμού πάνω από 200 εκατ. ευρώ και αποτελείται: από ένα Ταμιευτήρα 38.500 στρ. με αναχώματα 23 χιλιομέτρων, 4 συλλεκτήρες 28 χιλιομέτρων, ορισμένα έργα εισόδου και εξόδου του νερού, αντλιοστάσια, έργα μεταφοράς νερού για άρδευση, έργα ύδρευσης περιοχής Βόλου, έργα υδροβιοτόπων, οικότουριστικής ανάπτυξη, έργα ορεινής υδρονομίας κ.λπ.

Οι εργασίες του ομώνυμου Ταμιευτήρα άρχισαν πριν από 10 χρόνια (σύμβαση 24/9/1999) στην περιοχή της Κάρλας και ήδη απορροφήθηκαν περίπου 170 εκ. ευρώ (εκ των οποίων 38 εκ. για απαλλοτριώσεις και 9,2 για αρχαιολογία).

Η χωρητικότητα του Ταμιευτήρα είναι 180 εκατ. κ.μ. και η ωφέλιμη 60 εκατ. κ.μ., ενώ προβλέπεται να γεμίζει με νερό από τον Πηνεϊό (70-80%) και με νερό χειμερινών απορροών (20-30%) από τις γύρω λεκάνες.

Οι υλοποιήσιμες εργασίες αφορούν κυρίως την επέκταση του συλλεκτήρα Σ3 (απομένουν 5,7 χιλιόμετρα από τα 18) με τα έργα αποχέτευσης - προσέλασης, την ολοκλήρωση των Σ6 - Σ7, μπάζωματα στις τάφρους (2 Τ, 1 Τ), τα «έργα ορεινής υδρονομίας», κ.ά.

## α) ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

### 1. «ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΚΑΡΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ»

Το έργο περαιώθηκε την 30/6/2006 με συνολική δαπάνη 98.885.749,76 ευρώ με ΦΠΑ.

Έχει συντελεστεί η οριστική παραλαβή του έργου.

### 2. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Π. ΠΗΝΕΙΟ»

Το έργο ολοκληρώθηκε την 31/01/2010 με συνολική δαπάνη ποσού 6.194.593,61 ευρώ με Φ.Π.Α.

### 3. «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ 7Τ - 2Τ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ»

Η υπογραφή σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 626.623,25 ευρώ με Φ.Π.Α.

## β) ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

### 1. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ (Α' ΦΑΣΗ)»

Η σύμβαση υπογράφηκε την 20-05-2008 και ανέρχεται

Ο περιφερειαρχης ανέφερε όμως και το γεγονός ότι «ο Πννεϊός και η Κάρλα δεν φέρνουν από μόνα τους να λύσουν το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης νερού στη Θεσσαλία. Αν δεν ολοκληρωθούν τα έργα μεταφοράς νερού από την άνω ρου του Αχελώου και παράλληλα τα δίκτυα σύνδεσης με τον Πννεϊό τα προβλήματα που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον θα είναι μη αναστρέψιμα», ενώ ανέφερε και τις τεκμηριωμένες απόψεις πολλών επιστημόνων και ειδικών που μιλούν για «ερμηποίηση» της Θεσσαλίας αν δεν ολοκληρωθούν τα έργα του Αχελώου.

Επίσης ο κ. Αγοραστής ανέφερε ότι θα επιδώξει μια σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ για να δοθεί μια λύση στο σοβαρό αυτό ζήτημα. Παράλληλα ανέφερε ότι οι υπηρεσίες της Περιφέρειας πραγματοποιούν ελέγχους για την ποιότητα του νερού και των ψαριών και ότι τα πρόσφατα τοξικολογικά αποτελέσματα δεν εμπνέουν κίνδυνο ανησυχίας.

Από την πλευρά του Φορέα Διαχείρισης η πρόεδρος κ. Ιφιγένεια Καγκάλου δήλωσε ότι ο Φορέας δεν έχει τις θεσμικές αρμοδιότητες για να εποπτεύει τα έργα στην Κάρλα αλλά ούτε και σαφείς εντολές από το ΥΠΕΚΑ για την παρακολούθηση και τη λειτουργία τους. Ενώ η δ/ντρια της ΕΥΔΕ Κάρλας κ. Ξένια Καρατζά ανέφερε τις εργαλαβίες που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή αλλά και την αδυναμία λειτουργίας των αντλιοστασίων.

Στη σύσκεψη ακόμη παρευρέθηκαν οι κ. ΑΛ. Σπανός και ΑΛ. Κοέν από την ΕΥΔΕ Κάρλας, και ο κ. Π. Σιδηρόπουλος απ' τον Φορέα Διαχείρισης.

Το έργο της επαναδημιουργίας της λίμνης Κάρλας έχει κυρίως περιβαλλοντικό χαρακτήρα και είναι το μεγαλύτερο που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα στην περιοχή των Βαλκανίων. Στόχος του είναι:

- \* Η περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, της κλωρίδας και της πανίδας. Με το έργο επιτυγχάνεται η υποστήριξη της άγριας ζωής και ιδιαίτερα της ορνιθοπανίδας μεταναστευτικών πτηνών.

- \* Η αποτελεσματική αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής με δεδομένο ότι ευρίσκεται υψομετρικά στο χαμηλότερο σημείο του Θεσσαλικού κάμπου.

- \* Η βαθμιαία βελτίωση της ποιότητας και η αύξηση της αξιοποιήσιμης ποσότητας των επιφανειακών νερών. Με την κατασκευή του ταμιευτήρα αυξάνονται τα αποθέματα των επιφανειακών νερών και δίνονται δυνατότητες για την κατακράτηση και τον καθαρισμό των στραγγισμάτων από την άρδευση των καλλιιεργειών με φυσικές διαδικασίες.

- \* Τη βαθμιαία ανάταση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα των παρακάρλιων περιοχών. Τα νερά του ταμιευτήρα θα υποκαταστήσουν την χρήση των υπογείων νερών για άρδευση που σήμερα πραγματοποιείται μέσω ιδιωτικών γεωτρήσεων (7.000 περίπου) που οι περισσότερες εξ αυτών προβλέπεται να καταργηθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση των έργων άρδευσης.

- \* Την εξεύρεση επαρκών ποσοτήτων πόσιμου νερού από γεωτρήσεις για την ενίσχυση της ύδρευσης του πολεοδομικού συγκροτήματος μείζονος περιοχής Βόλου.

Η παράμετρος αυτή είναι η σπουδαιότερη διότι έχει το μεγαλύτερο δείκτη ωφελιμότητας για τους κύκλους της Ε.Ε. και τη μεγαλύτερη συμμετοχή ώστε το έργο αυτό να έχει κριθεί ως αμιγώς περιβαλλοντικό.

- \* Την αναμενόμενη αλλαγή του μικροκλίματος της περιοχής (χαμηλότερες το θέρος, υψηλότερες το χειμώνα)

- \* Την ήπια αγροτουριστική ανάπτυξη της περιοχής και τη συνακόλουθη ελάττωση ανεργίας.

- \* Την αναβάθμιση της αισθητικής του τοπίου.

Το έργο της επανασύστασης της Λίμνης Κάρλας είναι ένα σύνθετο έργο που υλοποιείται με 8 εργαλαβίες προ-

στο ποσό των 24.842.941,49 ευρώ με Φ.Π.Α. Η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του είναι 25-05-2012.

## 2. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (Α' ΦΑΣΗ)»

Η σύμβαση υπογράφηκε την 06-06-2008 και ανέρχεται στο ποσό των 7.903.935,92 ευρώ με Φ.Π.Α., έχει συνταχθεί και εγκριθεί ο 1ος ΑΠΕ σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και ανέρχεται σε ποσό των 8.457.513,26 ευρώ με Φ.Π.Α.

## 3. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (Α' ΦΑΣΗ)»

Η σύμβαση υπογράφηκε την 06-06-2008 και ανέρχεται στο ποσό των 7.903.935,92 ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Αλ. Μπαλτατζής προκειμένου να υλοποιηθεί

## 4. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ»

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 30-12-2009 και ανέρχεται στο ποσό των 4.151.823,08 ευρώ με Φ.Π.Α.

Η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου είναι η 29-03-2012.

## 5. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Α' ΦΑΣΗΣ»

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 19-07-2010 και ανέρχεται στο ποσό των 12.416.586,15 ευρώ με Φ.Π.Α.

### γ) ΥΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

## 1. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ»

Προϋπολογισμός μελέτης 12.900.000 ευρώ με Φ.Π.Α.

### δ) ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

## 1. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)»

Ο προϋπολογισμός της εργαλαβίας της Β' Φάσης, εκτιμάται σε 3.500.000 ευρώ περί ήτου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

## 2. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ (Β' ΦΑΣΗ)»

Ο προϋπολογισμός της εργαλαβίας της Β' Φάσης, εκτιμάται σε 7.000.000 ευρώ περίπου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

### Σε ό,τι αφορά στις μελέτες:

1. Έχει ανατεθεί σε Τεχνικό Σύμβουλο της Δ/σης Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7) η μελέτη της «Μεταφοράς νερών του Ταμιευτήρα Γυρτώνης στη λίμνη Κάρλα μέσω των τάφρων 9Τ και 7Τ» ύψους δαπάνης 158.138,00 ευρώ και η οποία εξασφαλίζει την πλήρωσή της με βαρύτητα εξοικονομώντας ενέργεια 5GWh. Έχουν πραγματοποιηθεί οι τοπογραφικές εργασίες και βρίσκεται σε εξέλιξη η σύνταξη της υδραυλικής μελέτης.

## 2. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Β' ΦΑΣΗ»

Το φυσικό αντικείμενο της εν λόγω μελέτης θα περιλαμβάνει τις υπολείπομενες εργασίες που δεν έχουν υλοποιηθεί για διαφόρους λόγους απ' όλες τις προαναφερθείσες εργαλαβίες, την επέκταση του Συλλεκτήρα Σ3 για άλλα 13 χιλιόμετρα περίπου και από όσες θα καταγραφού από την Υπηρεσία μας και κριθούν ότι είναι απαραίτητες να εκτελεστούν προκειμένου το συνολικό έργο να είναι άριστο από άποψη αρτιότητας και λειτουργικότητας.

## 3. «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ»

Προϋπολογισμός της μελέτης 400.000 ευρώ συν Φ.Π.Α.

Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και υπολείπεται η συμβατική υποχρέωση του μελετητή της εκπαίδευσης στελεχών του Φορέα Διαχείρισης και της Δ/σης Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7).
