

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

α. Γενικά στοιχεία

- Έναρξη : 1972
- Πέρασ : 1986
- Προϋπολογισμός : 4,6 δισ. δραχ.
- Πίστωση που απορροφήθηκε μέχρι τέλους 1986: 4,4 δισ. δραχ.
- Εγκριθείσα πίστωση το 1986: 100.000.000 δραχ.
- Καθαρή καλλιεργούμενη έκταση: 420.000 στρ.

ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ

- Νομός Καρδίτσας	: 111.000 στρ.
- Νομός Τρικάλων	: 121.000 »
- Νομός Λάρισας	: 184.000 »
- Νομός Μαγνησίας	: 3.000 »
- Νομός Φθιώτιδας	: 1.000 »

- Αρδευθείσα έκταση το 1986: 279.503 στρ.

ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ


- Νομός Καρδίτσας	: 94.653 στρ.
- Νομός Τρικάλων	: 69.400 »
- Νομός Λάρισας	: 113.000 »
- Νομός Μαγνησίας	: 968 »
- Νομός Φθιώτιδας	: 1.482 »

β. Εργασίες που έγιναν

- Ανορύχτηκαν: 1427 γεωτρήσεις (εκμεταλλεύσεως, ερευνητικές, πιεζομετρικές)
- Ηλεκτροδοτήθηκαν: 1130 γεωτρήσεις
- Εξοπλίστηκαν ηλεκτρομηχανολογικά: 1130 γεωτρήσεις (οι υπόλοιπες δεν εξοπλίστηκαν ως αποτυχούσες, ερευνητικές, πιεζομετρικές)
- Στραγγιστικά - Αποχετευτικά δίκτυα: 200.000 στρ. (1060 χλμ.)
- Αγροτικό οδικό δίκτυο:
 - Χωματοουργικά: 200.000 στρ. (1070 χλμ.)
 - Αμμοχ/ση : 1.000 χλμ.
- Υπόγεια αρδευτικά δίκτυα: 40.500 στρ.
- Αρδευτικά δίκτυα σε ανοιχτές διώρυγες: 24.500 στρ.
- Επιφανειακά δίκτυα τεχνητής βροχής: 2,3 εκατ. μ. Φ 150 και 120 χλστ. 355.000 στρ.
- Αναδασμός: 200.000 στρ.

γ. Λοιπά στοιχεία

- Χρηματοδότηση: Διεθνής Τράπεζα Επενδύσεων και Ανασυγκροτήσεως με 25 εκατομμύρια δολάρια
- Υδρογεωλογική μελέτη: Γαλλικός οίκος Sogreah
- Φορέας κατασκευής του έργου: Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων Υπουργείου Γεωργίας
- Φορέας Διοικήσεως του έργου: Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.)
- Μέση παροχή ανά γεώτρηση : 130 κ.μ./ώρα
- Μέση αρδευόμενη έκταση ανά γεώτρηση : 400 στρ.
- Μέθοδος άρδευσης : Κυρίως τεχνητή βροχή.
- Μέσο κόστος διοικήσεως και λειτουργίας του έργου κατά το 1986: 1.800 δραχ./στρ. (από τις οποίες 1.200 δραχ./στρ. για ενέργεια).

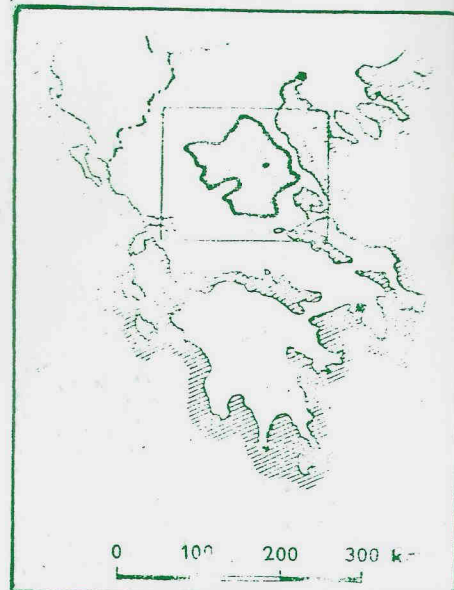

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΙΙΙ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ, Μάρτιος 1987

